

SLINDA
■■■■ Site Investigation ■■■■

40123 BOLOGNA ■ Via Collegio di Spagna, 15 ■ Tel.051-333802

Certificato N : 128-98

Data : 05-08-98

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

COMMITTENTE : ANGELICI M.

CANTIERE : C.DA SALVANO

PENETROMETRO : DPL

COMUNE : FERMO

LOCALITA' : SALVANO

PICCHETTO :

PROVA N.RO : 24 DEL : 27-01-84

INIZIO A ML : 0.00

FINE A ML : 7.40

Q.TA PIANO CAMPAGNA : 0.00

COMMENTI :

P₂₄ documentazione reperita
cantiere: c.da Salvano

TECNICO :

LABORATORIO :

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

CERTIFICATO N.RO : 128-98

CANTIERE : C.DA SALVANO

PROF.	NC	RD.	PROF.	NC	RD.	PROF.	NC	RD	PROF.	NC	RD
0.00	1	3.54	5.00	3	6.91						
0.10	25	88.39	5.10	3	6.91						
0.20	30	106.07	5.20	5	11.51						
0.30	25	88.39	5.30	5	11.51						
0.40	27	95.46	5.40	8	18.42						
0.50	30	106.07	5.50	8	18.42						
0.60	23	81.32	5.60	6	13.81						
0.70	16	56.57	5.70	6	13.81						
0.80	12	42.43	5.80	3	6.91						
0.90	18	63.64	5.90	7	16.12						
1.00	18	57.48	6.00	7	15.07						
1.10	18	57.48	6.10	7	15.07						
1.20	6	19.16	6.20	5	10.76						
1.30	8	25.55	6.30	5	10.76						
1.40	8	25.55	6.40	5	10.76						
1.50	6	19.16	6.50	5	10.76						
1.60	6	19.16	6.60	7	15.07						
1.70	8	25.55	6.70	7	15.07						
1.80	8	25.55	6.80	10	21.52						
1.90	8	25.55	6.90	16	34.43						
2.00	8	23.29	7.00	16	32.33						
2.10	8	23.29	7.10	16	32.33						
2.20	11	32.03	7.20	16	32.33						
2.30	11	32.03	7.30	16	32.33						
2.40	11	32.03	7.40	16	32.33						
2.50	11	32.03									
2.60	9	26.21									
2.70	9	26.21									
2.80	9	26.21									
2.90	12	34.94									
3.00	12	32.11									
3.10	12	32.11									
3.20	12	32.11									
3.30	12	32.11									
3.40	12	32.11									
3.50	6	16.05									
3.60	10	26.76									
3.70	30	80.27									
3.80	23	61.54									
3.90	16	42.81									
4.00	16	39.60									
4.10	16	39.60									
4.20	13	32.17									
4.30	13	32.17									
4.40	7	17.32									
4.50	5	12.37									
4.60	3	7.42									
4.70	3	7.42									
4.80	3	7.42									
4.90	3	7.42									


P₂₄ documentazione reperita
cantiere: c.da Salvano

LEGENDA : PROF. = PROFONDITA' DI INFISSIONE m.
NC = NUMERO COLPI N.RO
RD = RESISTENZA DINAMICA daN/cm²

DPL Dynamic Penetrometer Light

Picchetto n.
Cantiere
C.DA SALVANO
Committente ANGELICI M.

Certif.n. 128-98
del 05/08/1998

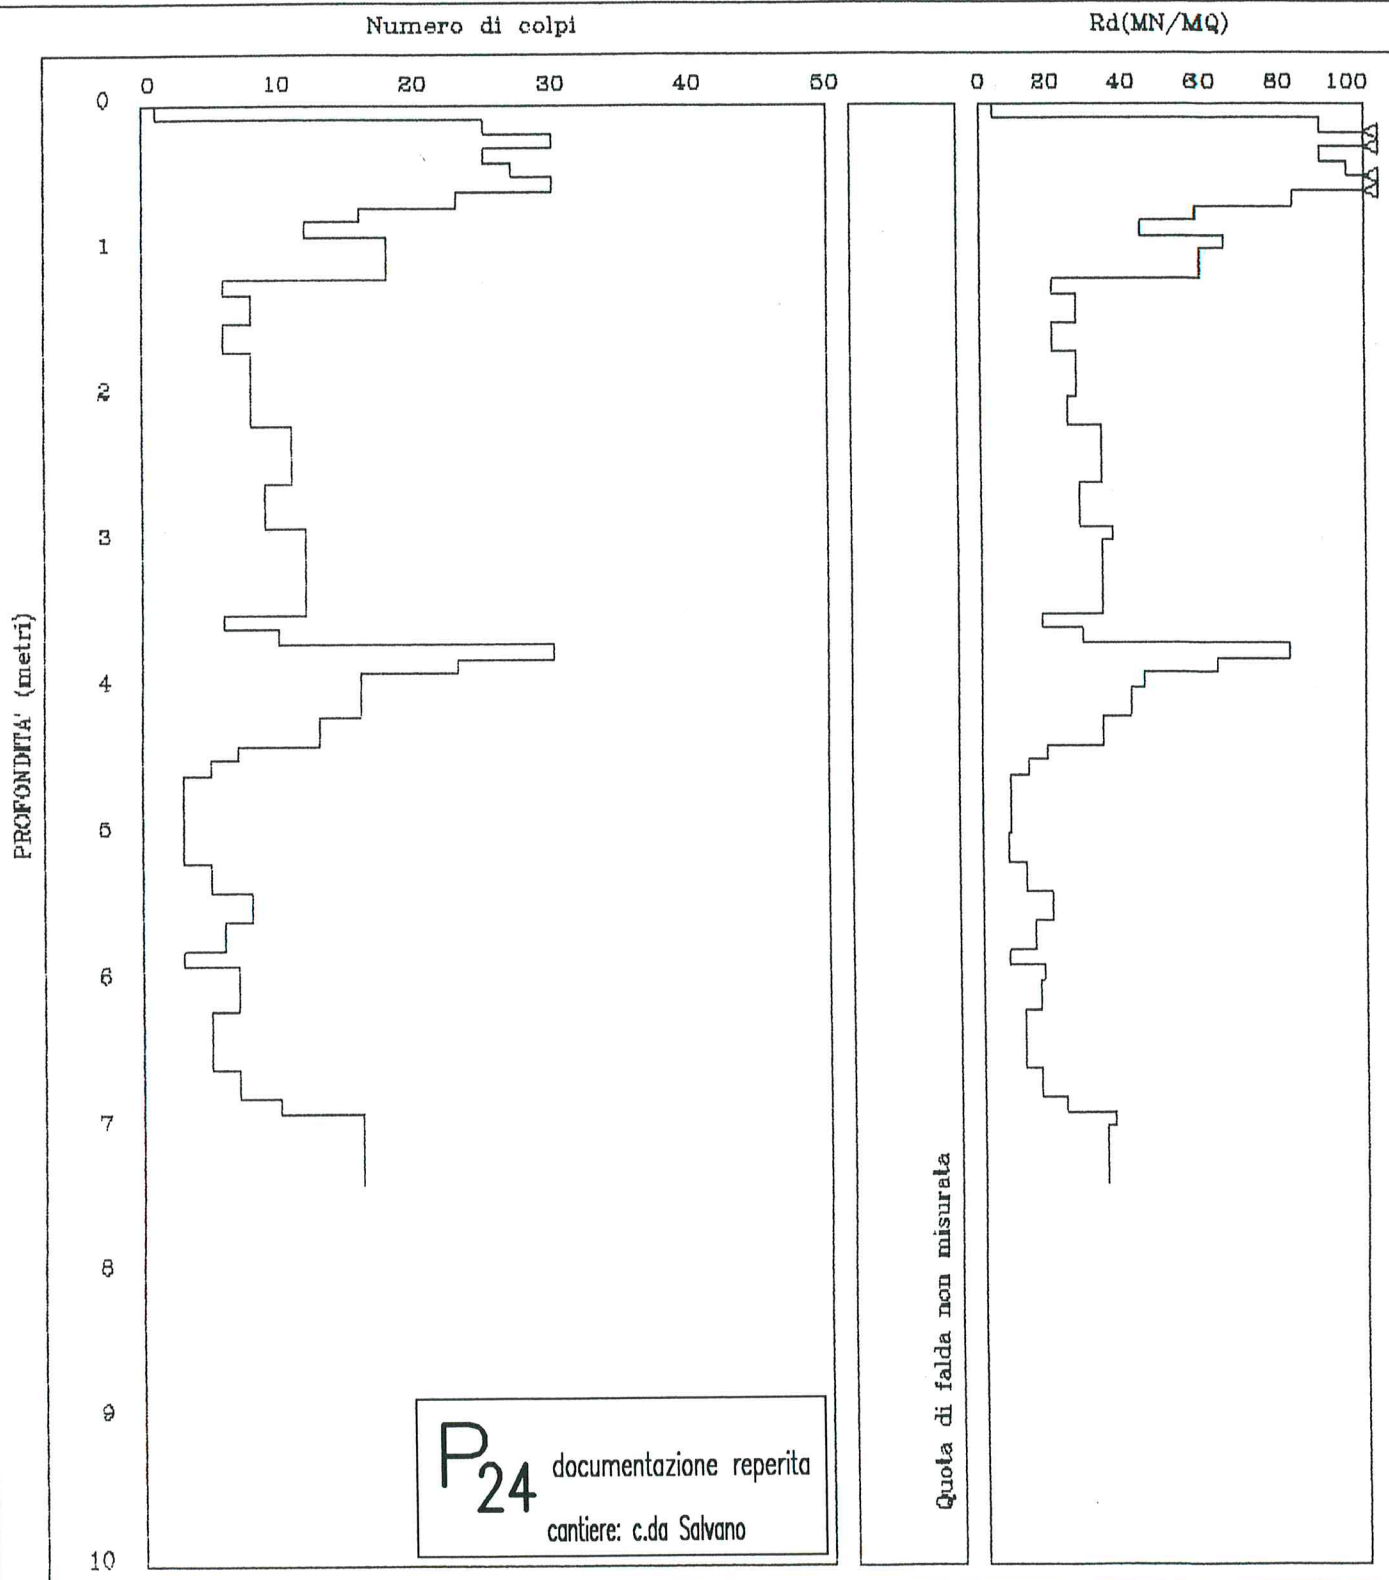

CERTIFICATO N.RO : 128-98

CANTIERE :C.DA SALVANO

QUOTA m.	LITOLOGIA	FALDA m.	N.RO COLPI	C	Nspt equiv.	DENS. REL.%	ANGOLO ATTRITO	GAMMA kN/mc	SIGMA daN/cm ²	Cu daN/cm ²	E daN/cm ²	M daN/cm ²	N'	TAU, SIGM _v
0.00	AG #####													
0.30	AG #####													
0.60	AG #####													
0.60	LA ~ ~ ~ ~ ~		15	1.00	15			18.0	0.15	1.00	271		12	
0.90	LA ~ ~ ~ ~ ~													
1.10	LA ~ ~ ~ ~ ~													
1.10	LA ~ ~ ~ ~ ~		8	1.00	8			18.0	0.28	0.53	198		6	
1.40	LA ~ ~ ~ ~ ~													
1.70	LA ~ ~ ~ ~ ~													
2.00	LA ~ ~ ~ ~ ~													
2.10	LA ~ ~ ~ ~ ~													
2.10	LA ~ ~ ~ ~ ~													
2.40	LA ~ ~ ~ ~ ~		11	1.00	11			18.0	0.51	0.73	232		6	
2.70	LA ~ ~ ~ ~ ~													
3.00	LA ~ ~ ~ ~ ~													
3.30	LA ~ ~ ~ ~ ~													
3.60	LA ~ ~ ~ ~ ~													
3.60	LA ~ ~ ~ ~ ~		16	1.00	16			18.0	0.70	1.07	280		8	
3.90	LA ~ ~ ~ ~ ~													
4.20	LA ~ ~ ~ ~ ~													
4.30	LA ~ ~ ~ ~ ~													
4.30	LA ~ ~ ~ ~ ~		3	1.00	3			18.0	0.84	0.20	121		1	
4.60	LA ~ ~ ~ ~ ~													
4.90	LA ~ ~ ~ ~ ~													
5.10	LA ~ ~ ~ ~ ~													
5.10	LA ~ ~ ~ ~ ~													
5.40	LA ~ ~ ~ ~ ~		6	1.00	6			18.0	1.06	0.40	171		2	
5.70	LA ~ ~ ~ ~ ~													
6.00	LA ~ ~ ~ ~ ~													
6.30	LA ~ ~ ~ ~ ~													
6.60	LA ~ ~ ~ ~ ~													
6.70	LA ~ ~ ~ ~ ~													
6.70	LA ~ ~ ~ ~ ~		16	1.00	16			18.0	1.26	1.07	280		6	
7.00	LA ~ ~ ~ ~ ~													
7.30	LA ~ ~ ~ ~ ~													
7.40	LA ~ ~ ~ ~ ~													

T=TORBE - A=ARGILLE - LA=LIMI ARGILLOSI - LS=LIMI SABBIOSI - SL=SABBIE LIMOSE - S=SABBIE - SG=SABBIE/GHIAIE - AG-COPERTURA SUPER

P₂₄ documentazione reperita
cantiere: c.da Salvano
