

SUNDA
■■■■ Site Investigation ■■■■

40123 BOLOGNA ■ Via Collegio di Spagna, 15 ■ Tel.051-333802

Certificato N : 129-98

Data : 05-08-98

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

COMMITTENTE : ANGELICI M.

CANTIERE : C.DA SALVANO

PENETROMETRO : DPL

COMUNE : FERMO

LOCALITA' : SALVANO

PICCHETTO :

PROVA N.RO : 25 DEL : 27-01-84

INIZIO A ML : 0.00

FINE A ML : 7.80

Q.TA PIANO CAMPAGNA : 0.00

COMMENTI :

P₂₅ documentazione reperita
cantiere: c.da Salvano

TECNICO :

LABORATORIO :

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

CERTIFICATO N.RO : 129-98

CANTIERE : C.DA SALVANO

PROF.	NC	RD.	PROF.	NC	RD.	PROF.	NC	RD	PROF.	NC	RD
0.00	1	3.54	5.00	5	11.51						
0.10	25	88.39	5.10	5	11.51						
0.20	23	81.32	5.20	5	11.51						
0.30	27	95.46	5.30	5	11.51						
0.40	30	106.07	5.40	4	9.21						
0.50	29	102.54	5.50	4	9.21						
0.60	26	91.93	5.60	7	16.12						
0.70	17	60.11	5.70	7	16.12						
0.80	14	49.50	5.80	7	16.12						
0.90	15	53.04	5.90	3	6.91						
1.00	15	47.90	6.00	3	6.46						
1.10	15	47.90	6.10	3	6.46						
1.20	15	47.90	6.20	11	23.67						
1.30	15	47.90	6.30	11	23.67						
1.40	7	22.35	6.40	11	23.67						
1.50	7	22.35	6.50	7	15.07						
1.60	8	25.55	6.60	7	15.07						
1.70	8	25.55	6.70	7	15.07						
1.80	6	19.16	6.80	9	19.37						
1.90	7	22.35	6.90	9	19.37						
2.00	7	20.38	7.00	9	18.18						
2.10	7	20.38	7.10	9	18.18						
2.20	7	20.38	7.20	11	22.22						
2.30	11	32.03	7.30	15	30.31						
2.40	11	32.03	7.40	15	30.31						
2.50	11	32.03	7.50	15	30.31						
2.60	9	26.21	7.60	15	30.31						
2.70	9	26.21	7.70	15	30.31						
2.80	9	26.21	7.80	15	30.31						
2.90	13	37.85									
3.00	13	34.78									
3.10	13	34.78									
3.20	13	34.78									
3.30	11	29.43									
3.40	11	29.43									
3.50	11	29.43									
3.60	11	29.43									
3.70	7	18.73									
3.80	7	18.73									
3.90	20	53.51									
4.00	20	49.50									
4.10	20	49.50									
4.20	20	49.50									
4.30	15	37.12									
4.40	7	17.32									
4.50	5	12.37									
4.60	5	12.37									
4.70	5	12.37									
4.80	5	12.37									
4.90	5	12.37									

P₂₅ documentazione reperita
cantiere: c.da Salvano

LEGENDA : PROF. = PROFONDITA' DI INFISSIONE m.
NC = NUMERO COLPI N.RO
RD = RESISTENZA DINAMICA daN/cm²

DPL Dynamic Penetrometer Light

Picchetto n.

Cantiere

C.DA SALVANO


Committente ANGELICI M.

Certif.n. 129-98

del 05/08/1998

Numero di colpi

Rd(MN/MQ)

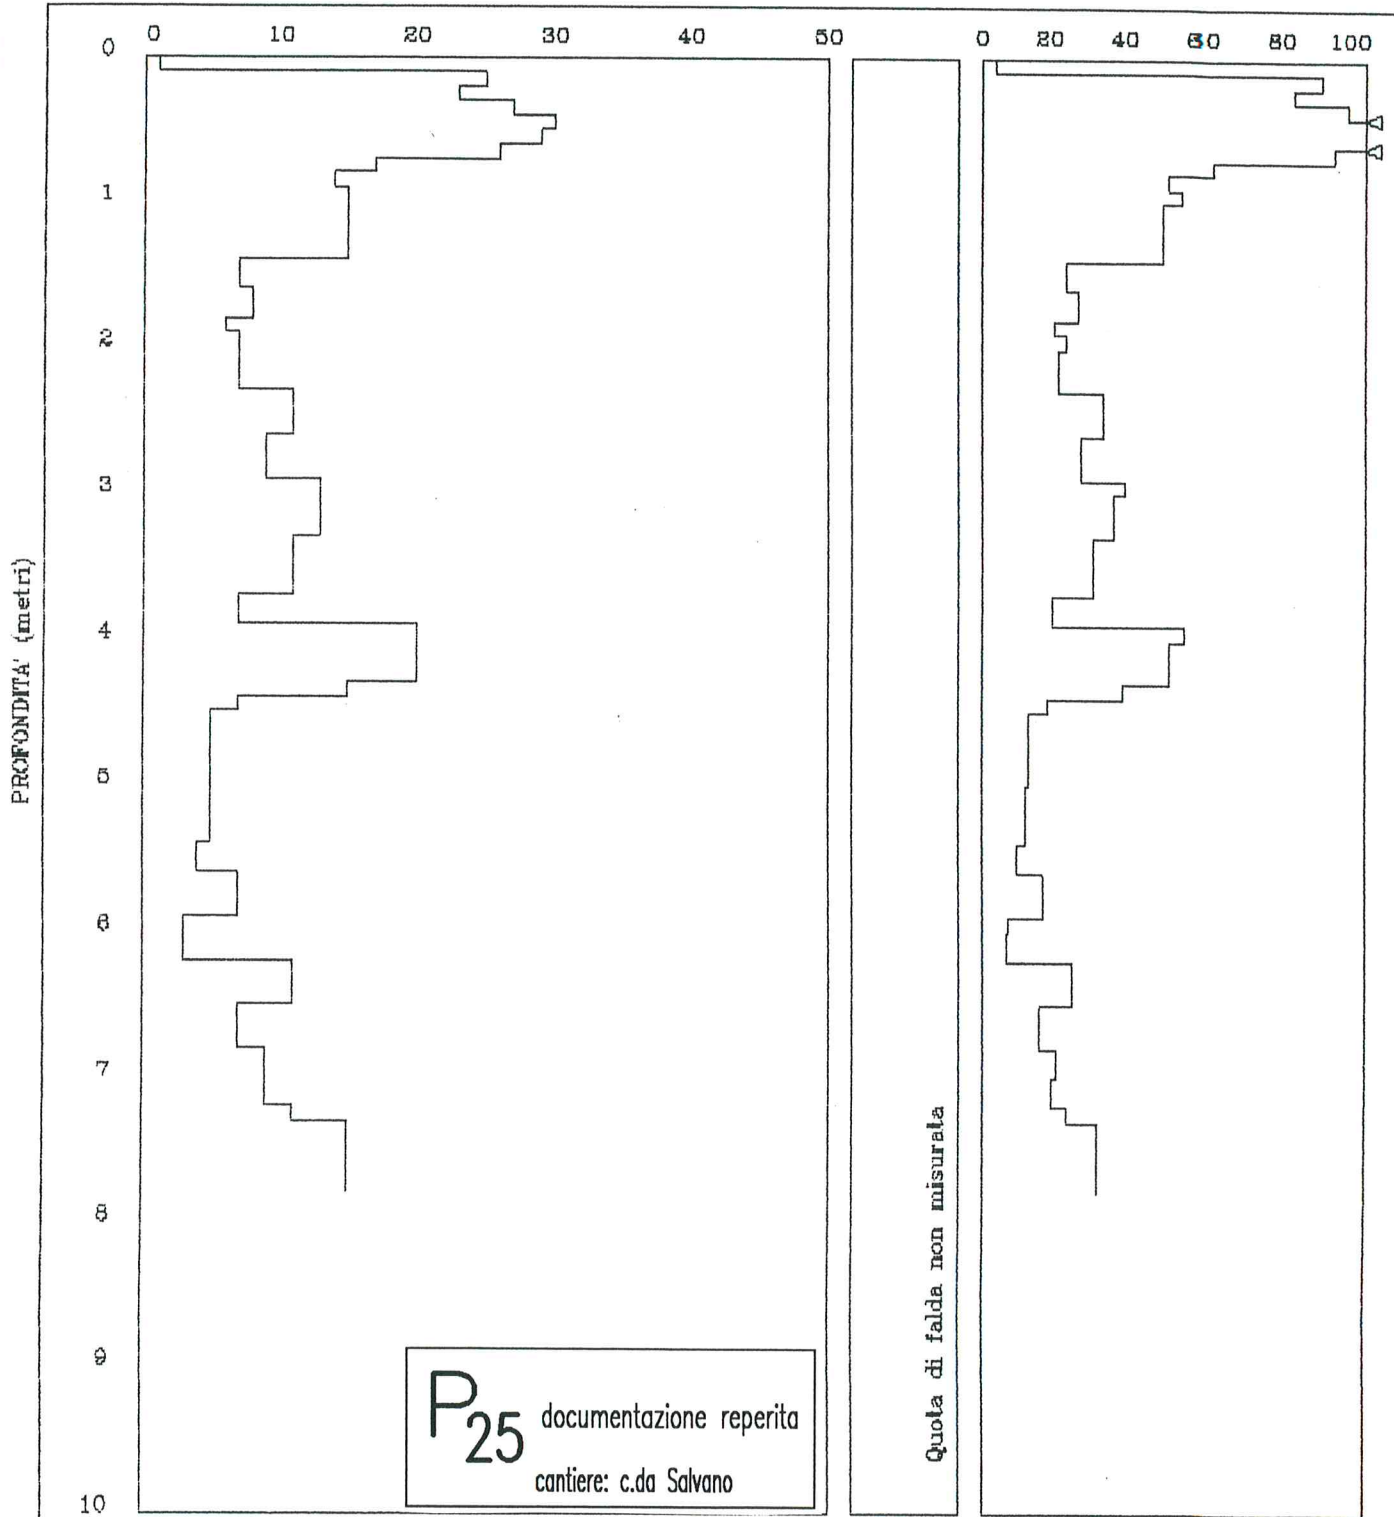

CERTIFICATO N.RO : 129-98

CANTIERE : C.DA SALVANO

QUOTA m.	LITOLOGIA	FALDA m.	N.RO COLPI	C	Nspt equiv.	DENS. REL. %	ANGOLO ATTRITO	GAMMA kN/mc	SIGMA daN/cm ²	Cu daN/cm ²	E daN/cm ²	M daN/cm ²	N'	TAU SIGM
0.00	AG	#####												
0.30	AG	#####												
0.60	AG	#####												
0.70	AG	#####												
0.70	LA	~ ~ ~ ~ ~	15	1.00	15			18.0	0.17	1.00	271		12	
1.00	LA	~ ~ ~ ~ ~												
1.30	LA	~ ~ ~ ~ ~												
1.30	LA	~ ~ ~ ~ ~	7	1.00	7			18.0	0.31	0.47	185		5	
1.60	LA	~ ~ ~ ~ ~												
1.90	LA	~ ~ ~ ~ ~												
2.20	LA	~ ~ ~ ~ ~												
2.20	LA	~ ~ ~ ~ ~												
2.50	LA	~ ~ ~ ~ ~	11	1.00	11			18.0	0.53	0.73	232		6	
2.80	LA	~ ~ ~ ~ ~												
3.10	LA	~ ~ ~ ~ ~												
3.40	LA	~ ~ ~ ~ ~												
3.70	LA	~ ~ ~ ~ ~												
3.80	LA	~ ~ ~ ~ ~												
3.80	LA	~ ~ ~ ~ ~	20	1.00	20			18.0	0.72	1.33	313		10	
4.10	LA	~ ~ ~ ~ ~												
4.30	LA	~ ~ ~ ~ ~												
4.30	LA	~ ~ ~ ~ ~												
4.60	LA	~ ~ ~ ~ ~	5	1.00	5			18.0	0.93	0.33	157		2	
4.90	LA	~ ~ ~ ~ ~												
5.20	LA	~ ~ ~ ~ ~												
5.50	LA	~ ~ ~ ~ ~												
5.80	LA	~ ~ ~ ~ ~												
6.10	LA	~ ~ ~ ~ ~												
6.10	LA	~ ~ ~ ~ ~	10	1.00	10			18.0	1.19	0.67	221		4	
6.40	LA	~ ~ ~ ~ ~												
6.70	LA	~ ~ ~ ~ ~												
7.00	LA	~ ~ ~ ~ ~												
7.20	LA	~ ~ ~ ~ ~												
7.20	LA	~ ~ ~ ~ ~	15	1.00	15			18.0	1.34	1.00	271		5	
7.50	LA	~ ~ ~ ~ ~												
7.80	LA	~ ~ ~ ~ ~												

T=TORBE - A=ARGILLE - LA=LIMI ARGILLOSI - LS=LIMI SABBIOSI - SL=SABBIE LIMOSE - S=SABBIE - SG=SABBIE/GHIAIE - AG=COPERTURA SUPER.

P₂₅ documentazione reperita
cantiere: c.da Salvano
